[redacted]

2018年4月26日～

工　程　表

プロジェクト名	顧 客 名	開 始 日	完了予定日	担当	施工	作 成 日
美容室 [redacted]	[redacted]	2018年5月14日	2018年5月22日	[redacted]	[redacted]	2018年4月26日
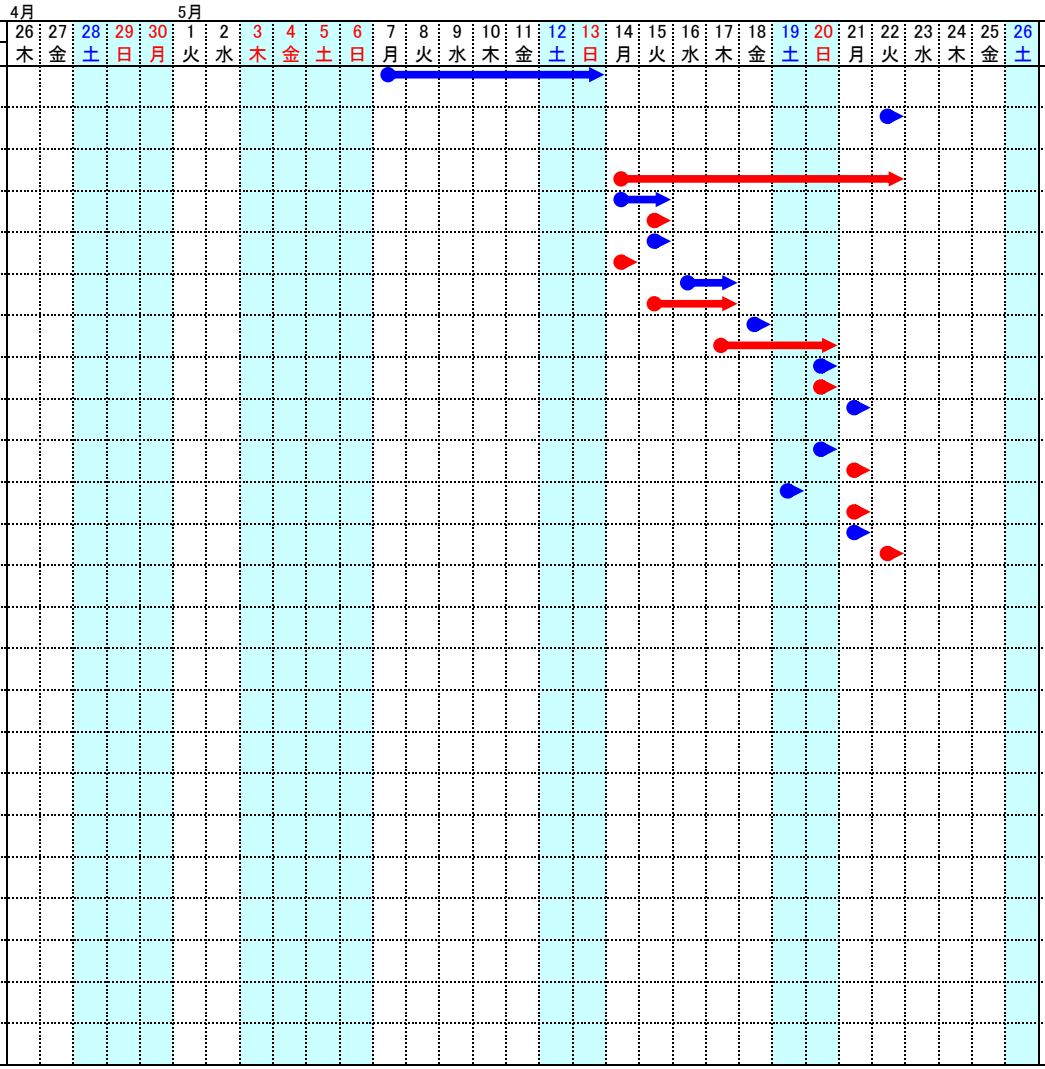
内　容	担当	予定日 開始	予定日 終了	実績日 開始	実績日 終了	備 考
準備工	オーナー	5/7	5/13			
オープン準備	オーナー	5/22	5/22			
工事期間	DAN			5/14	5/22	
解体工事(給排水衛生)	ファースト	5/14	5/15	5/15	5/15	
解体工事(電気空調設備)	リライト	5/15	5/15	5/14	5/14	
大工工事	中山	5/16	5/17	5/15	5/17	
内装工事	マコト	5/18	5/18	5/17	5/20	
塗装工事	サンワ	5/20	5/20	5/20	5/20	
シーリング工事	高沢	5/21	5/21			
電気・換気工事	リライト	5/20	5/20	5/21	5/21	
給排水衛生器具設置工事	ファースト	5/19	5/19	5/21	5/21	
床ｸﾘｰﾆﾝｸﾞWAX掛け	ビコー	5/21	5/21	5/22	5/22
